




_CRONOPROGRAMMA ECONOMICO

KM 429 architettura

via Circonvallazione Fosse n. 56
46019 Viadana [MN]
P.IVA 02591200353

info@km429architettura.com
www.km429architettura.com
T. 0375 780085




CAPOGRUPPO
Arch. Alessio Bernardelli
progettazione architettonica

Arch. Simona Avigni
progettazione architettonica

MATTIA PAVAROTTI Studio di Architettura

via N. Calipari n. 2
46047 Porto Mantovano [MN]
P.IVA 02144420201

mattiapavarotti@gmail.com
T. 348 3014953



Arch. Mattia Pavarotti

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt. 1 e seguenti del R.D. 07/11/1925 sul diritto di autore.



PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

\ 'Distretti del Commercio. Riqualificazione di Piazza dei Marinai e Piazza della Resistenza - Primo Stralcio.'

CUP:
CIG:

\ committente

Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa, 112, 46047
P.IVA 00313570202

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Rosanna Moffa

\ A_ARCHITETTONICO

\ Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

codice elaborato

PMR_PFTEA_CRO

\ data

15 luglio 2026

\ file

...

\ responsabili di progetto

Architetto Francesco Coroni
Architetto Roberto Bosi

\ revisioni

01	17.07.26		
REV.	DATA	ELABORATO	APPROVATO

Comune di Porto Mantovano

Provincia di Mantova

**Cronoprogramma di
PROGETTO**

OGGETTO: Distretti del Commercio. Riqualificazione di Piazza dei
Marinai e Piazza della Resistenza - Primo Stralcio.


COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

, 17/07/2026

Il Tecnico
()

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Luglio 2026												Agosto 2026						
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	
1	Lavori a MISURA	120 g	278´788,55																			
2	SICUREZZA	120 g	6´249,95																			
3	sicurezza	120 g	6´249,95																			
4	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzion ... cassone con gru. SPECIFI...	120 g	678,55																			
5	Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghez ... iteri di misurazione per 30 giorni consecutiv...	120 g	1´518,00																			
6	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 ... iteri di misurazione per 30 giorni consecutiv...	120 g	759,00																			
7	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastic ... cassone con gru. SPECIFI...	120 g	278,71																			
8	Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] = 200. Incluso: ... iteri di misurazione per 30 gio...	120 g	781,00																			
9	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato LV LAVORO: Montaggio. Inclu...	120 g	1´190,00																			
10	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica ge ... arghette per la certificazione EN 61-439...	120 g	425,18																			
11	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale gen ... ase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissag...	120 g	143,31																			
12	OPERA: Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = ... mm²] = 16 SPECIFICHE TECNIC...	120 g	26,20																			
13	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... P.01.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNIC...	120 g	450,00																			
14	OPERE EDILI	85 g	272´538,60																			
15	economie e assistenze	10 g	2´049,79																			
16	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECI ... onere per dare il lavoro finito a perfetta reg...	4 g	328,08																			
17	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	3 g	40,13																			
18	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D...	5 g	254,70																			
19	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto ... , operaio edile in fune (upsailo...	6 g	740,96																			
20	Autogrù telescopica; sbraccio [m] = 16; portata [t] = 15.	4 g	480,64																			
21	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a); portata [t] = 15,0	4 g	205,28																			
22	rimozioni	11 g	3´642,59																			
23	OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rim ... P Autocarro a cassone ribaltabi...	1 g	342,32																			
24	OPERA: Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Cap ... to. RP Autocarro a cassone ribaltabile; port...	1 g	35,02																			
25	OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: depos ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata ...	1 g	71,04																			
26	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria: ... pressione acustica [dB(A)] = 102; p...	5 g	78,28																			
27	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio. Escluso: ope ... escavatore cingolato; potenza [kW]...	5 g	1´647,87																			
28	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discar ... i distanza, di materiale già caricato sul mezzo...	1 g	144,09																			
29	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D...	1 g	590,05																			
30	OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale ge ... pressione acustica [dB(A)] = 1...	5 g	733,92																			
31	demolizioni	12 g	29´644,30																			
32	OPERA: Strato di sottofondo, leggermente armato di conglo ... 01 ÷ 13000. RT Martello ad aria compres...	7 g	2´295,05																			
33	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escl...	5 g	622,11																			
34	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D...	5 g	2´967,26																			


ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Luglio 2026												Agosto 2026																
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03											
35	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per ... iesel. Per profondità di taglio:- da 0 (zero) f...	5 g	94,92																													
36	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminos ... P Autocarro a cassone ribaltabi...	5 g	8'448,00																													
37	OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. ... carico e trasporto macerie a discar...	6 g	3'420,00																													
38	OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale gener ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t...	7 g	5'140,80																													
39	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escl...	7 g	640,80																													
40	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discar ... i distanza, di materiale già caricato sul mezzo...	7 g	3'734,40																													
41	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati	7 g	2'280,96																													
42	scavi	10 g	10'697,50																													
43	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- ... e residuo secco per l'espressione dei d...	5 g	30,08																													
44	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, ...	5 g	67,70																													
45	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti r ... P Autocarro a cassone ribaltabile; port...	5 g	4'941,60																													
46	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. I ... utocarro a cassone ribaltabi...	10 g	2'487,00																													
47	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti d ... ne Lavori, compresa la movimentazione...	10 g	316,00																													
48	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolt ... e scale, escluso il carico sull'automezzo:-...	8 g	181,12																													
49	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discar ... i distanza, di materiale già caricato sul mezzo...	8 g	2'178,40																													
50	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D...	8 g	495,60																													
51	sottoservizi e impianti	20 g	16'731,12																													
52	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni co ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] = ...	19 g	367,20																													
53	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); ... fianco; riempimento. RP Pala cingola...	20 g	4'456,00																													
54	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato ... schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/m...	20 g	3'040,40																													
55	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ca ... ello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza...	20 g	2'857,80																													
56	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione el ... P Escavatore cingolato; pote...	15 g	1'390,00																													
57	OPERA: Canaletta di metallo generico; geometria: andament ... scavatore cingolato; potenza [kW] = 1...	18 g	1'065,90																													
58	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm	14 g	1'021,30																													
59	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECI ... onere per dare il lavoro finito a perfetta reg...	20 g	1'312,32																													
60	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] = 0 ... pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg...	19 g	577,40																													
61	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] = 0 ... pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg...	20 g	642,80																													
62	sottofondi	27 g	57'862,15																													
63	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: dr ... otessile di plastica polipropilene (P...	24 g	851,40																													
64	OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di r ... utocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5...	22 g	10'682,54																													
65	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... ità di cm 20, con terreni aridi...	10 g	2'447,95																													
66	OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generic ... urazione per ogni installazio...	15 g	435,86																													
67	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diamet ... aggio; diametro mass...	24 g	33'475,65																													
68	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acci ... cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormon...	27 g	9'968,75																													

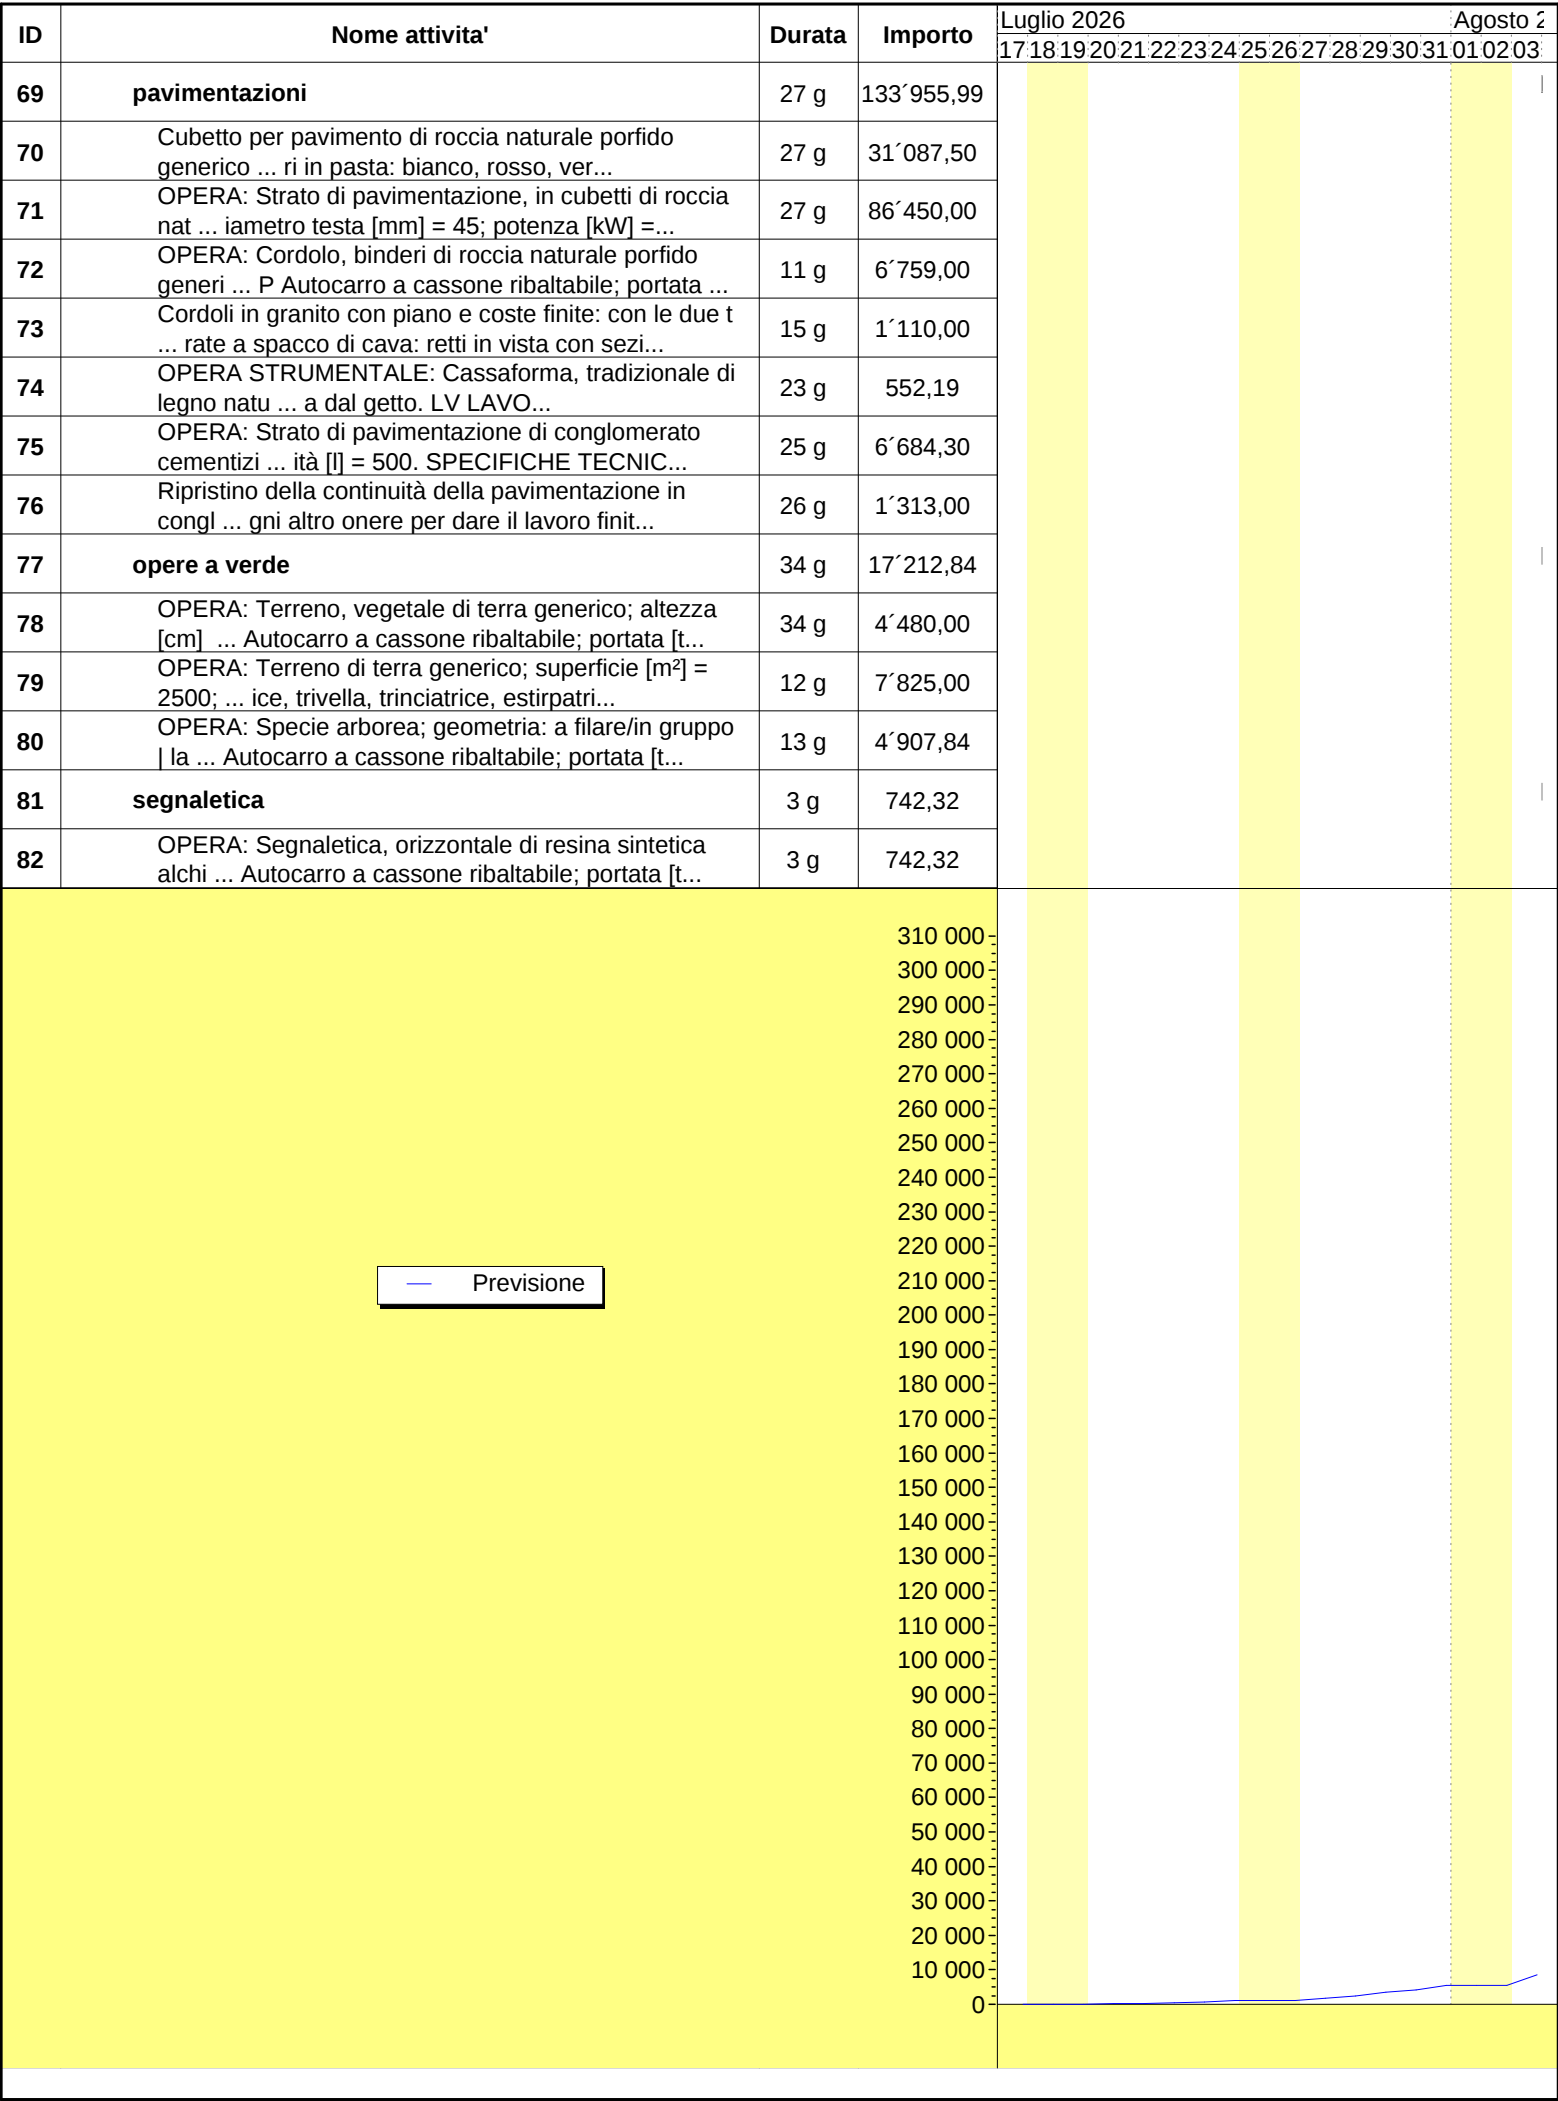



2026

Settembre 2026

0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	3	2	4	2	5	2	6	2	7	2	8	2	9	3	0	3	1	0	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

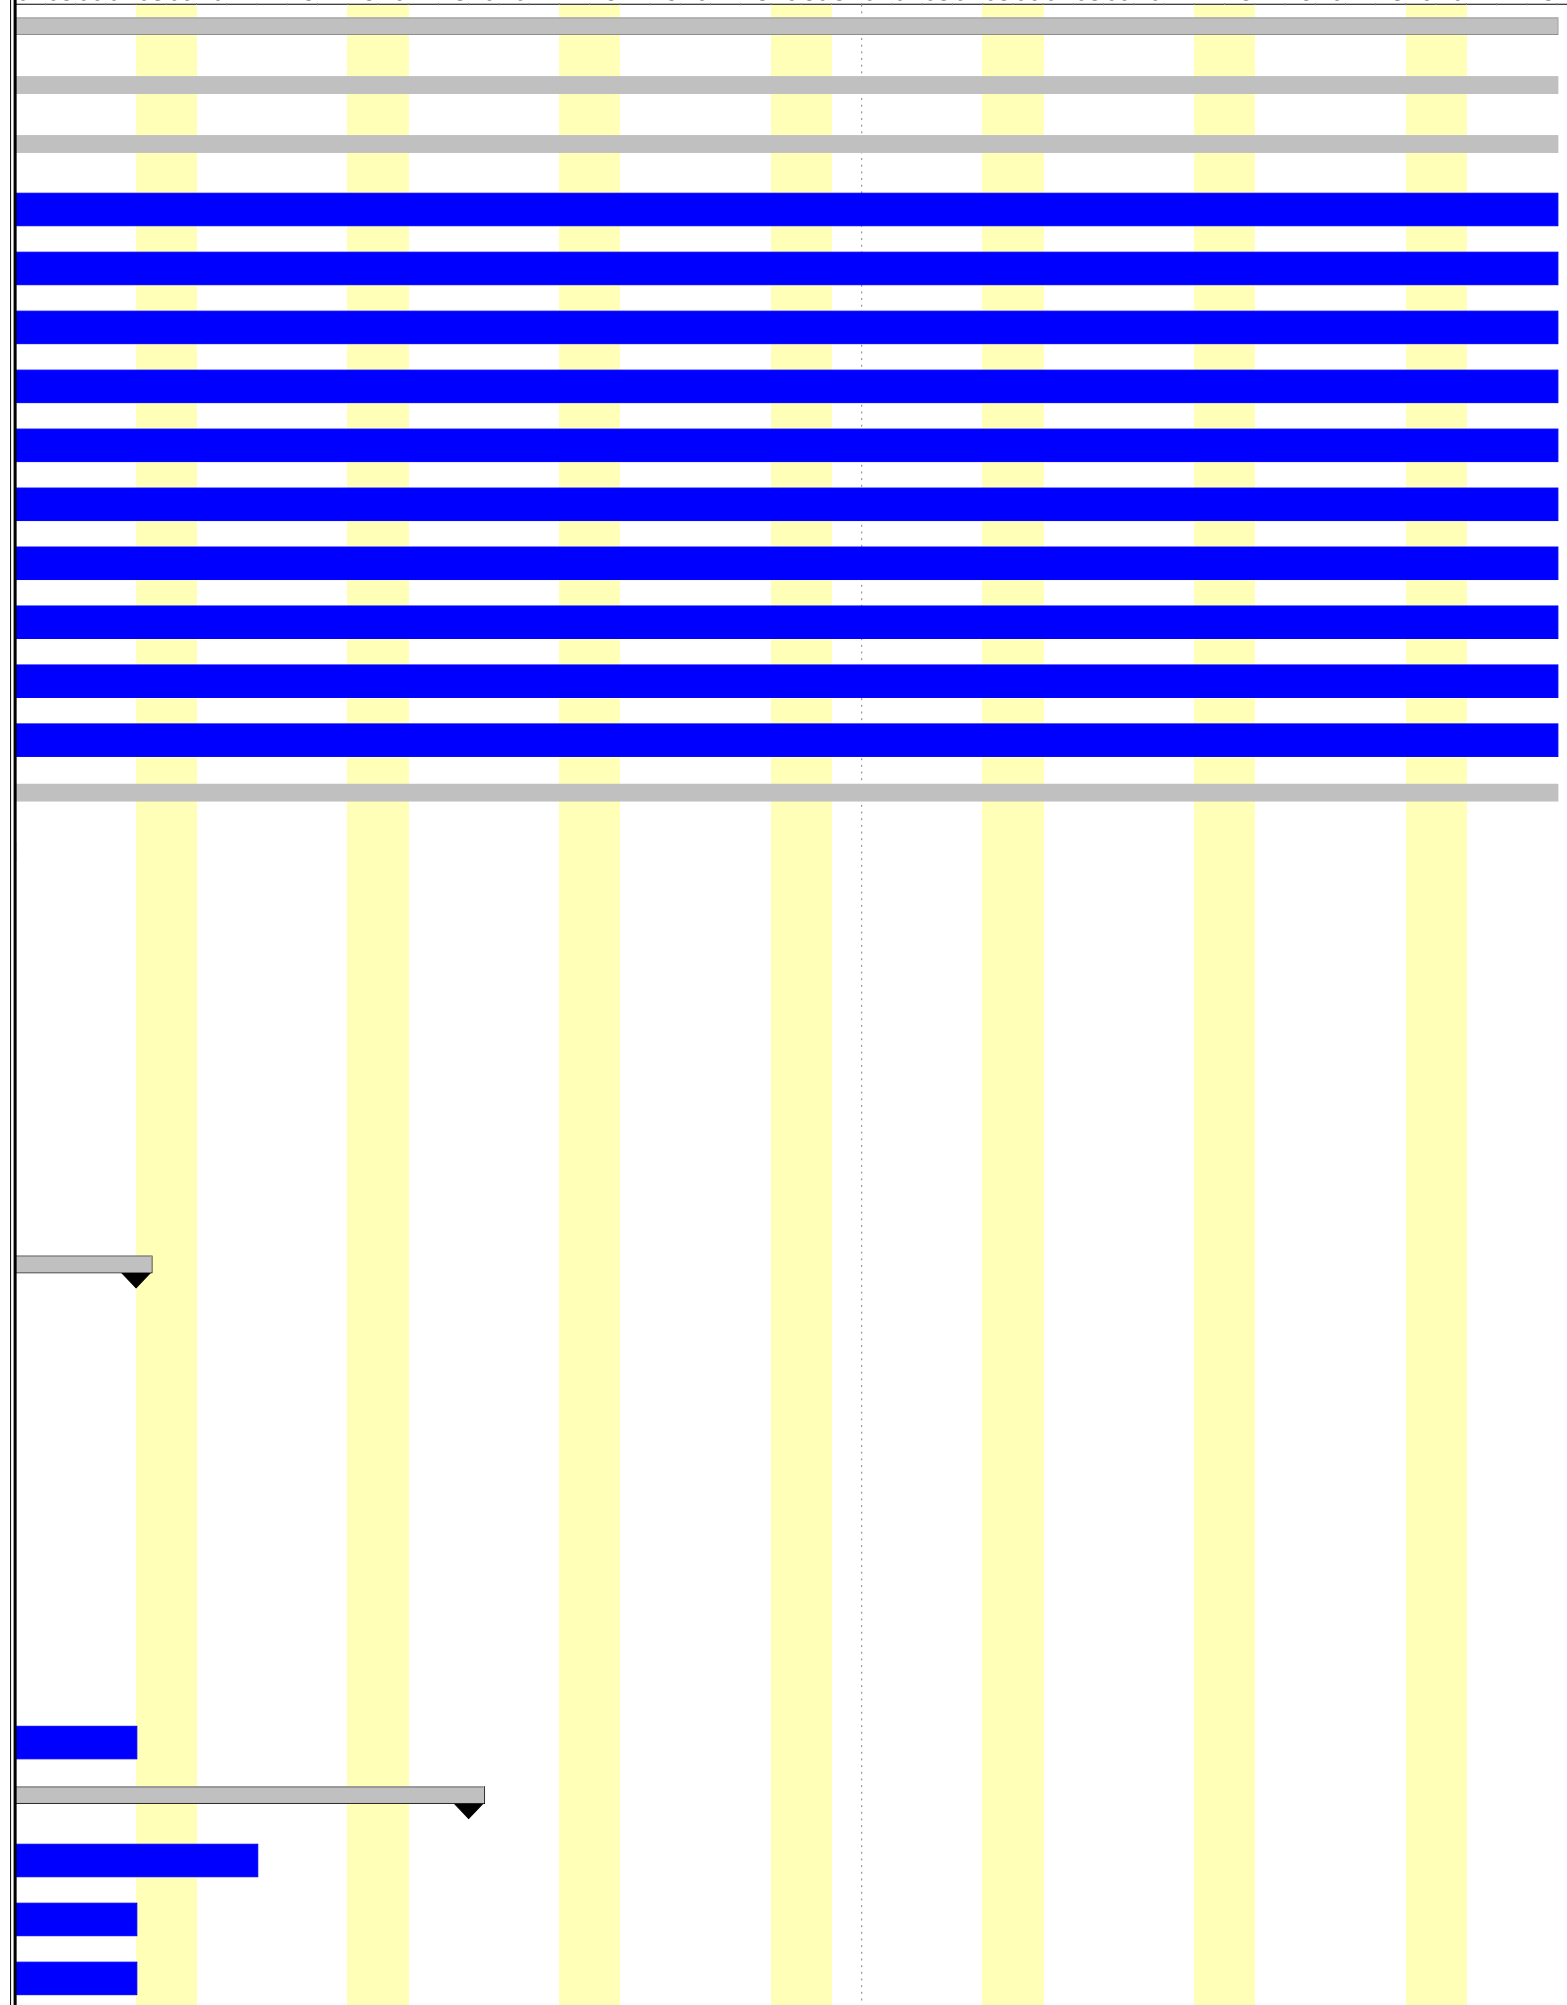

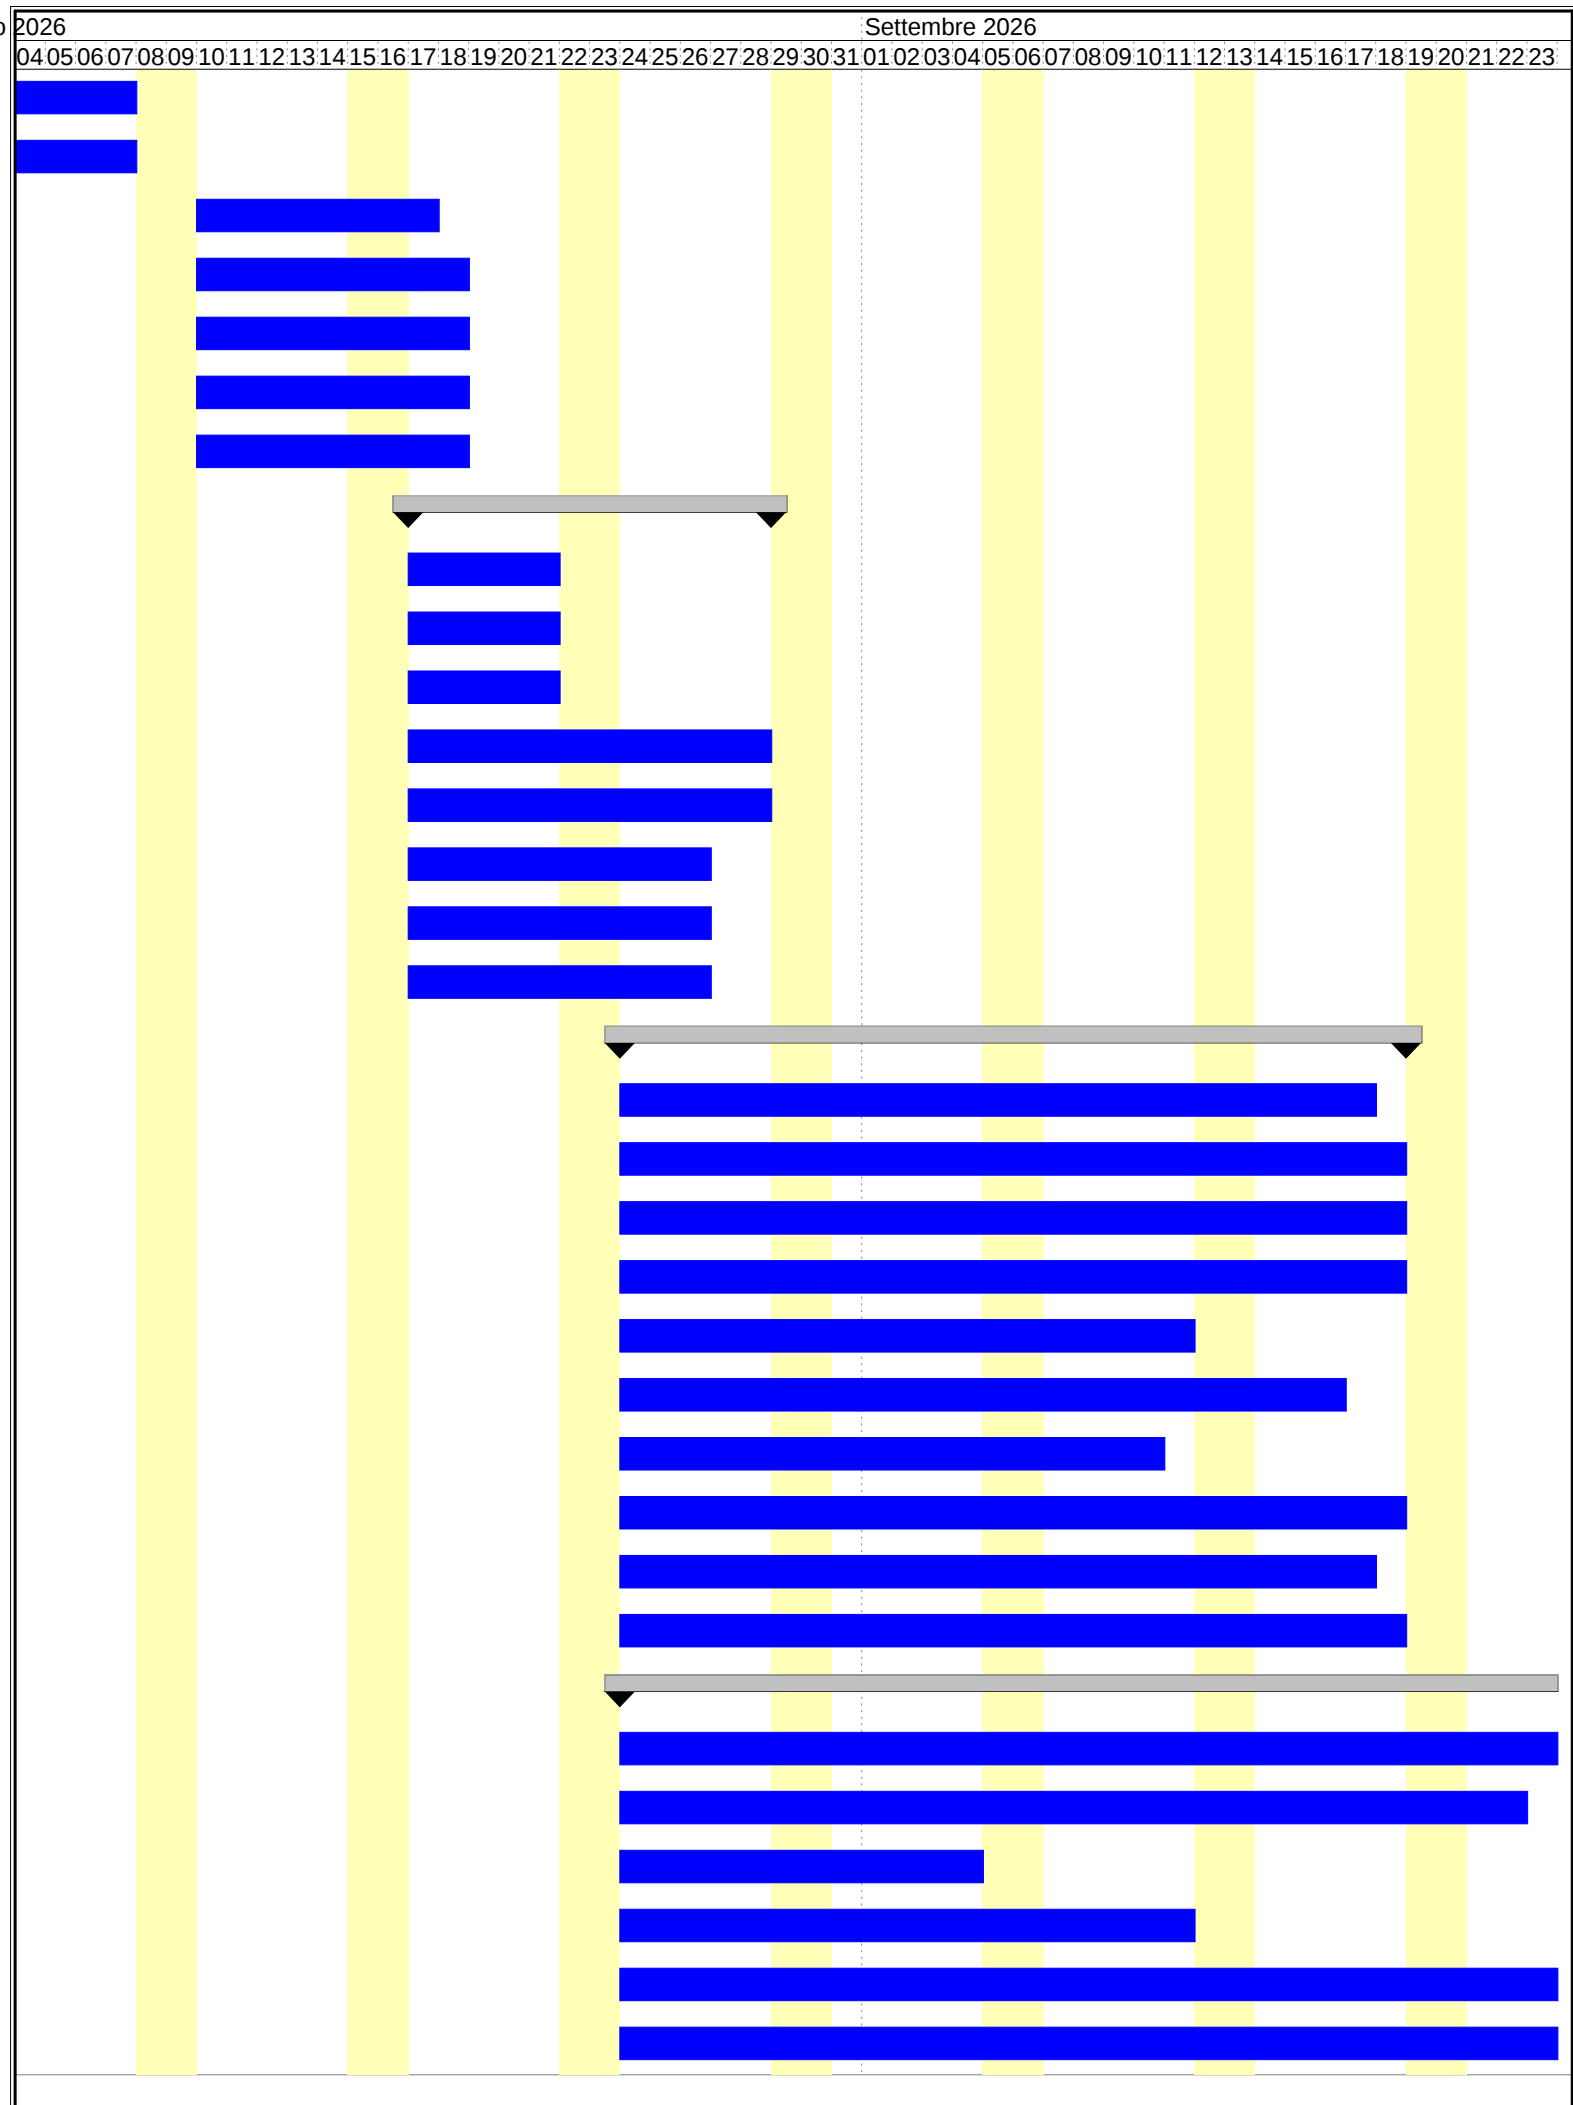

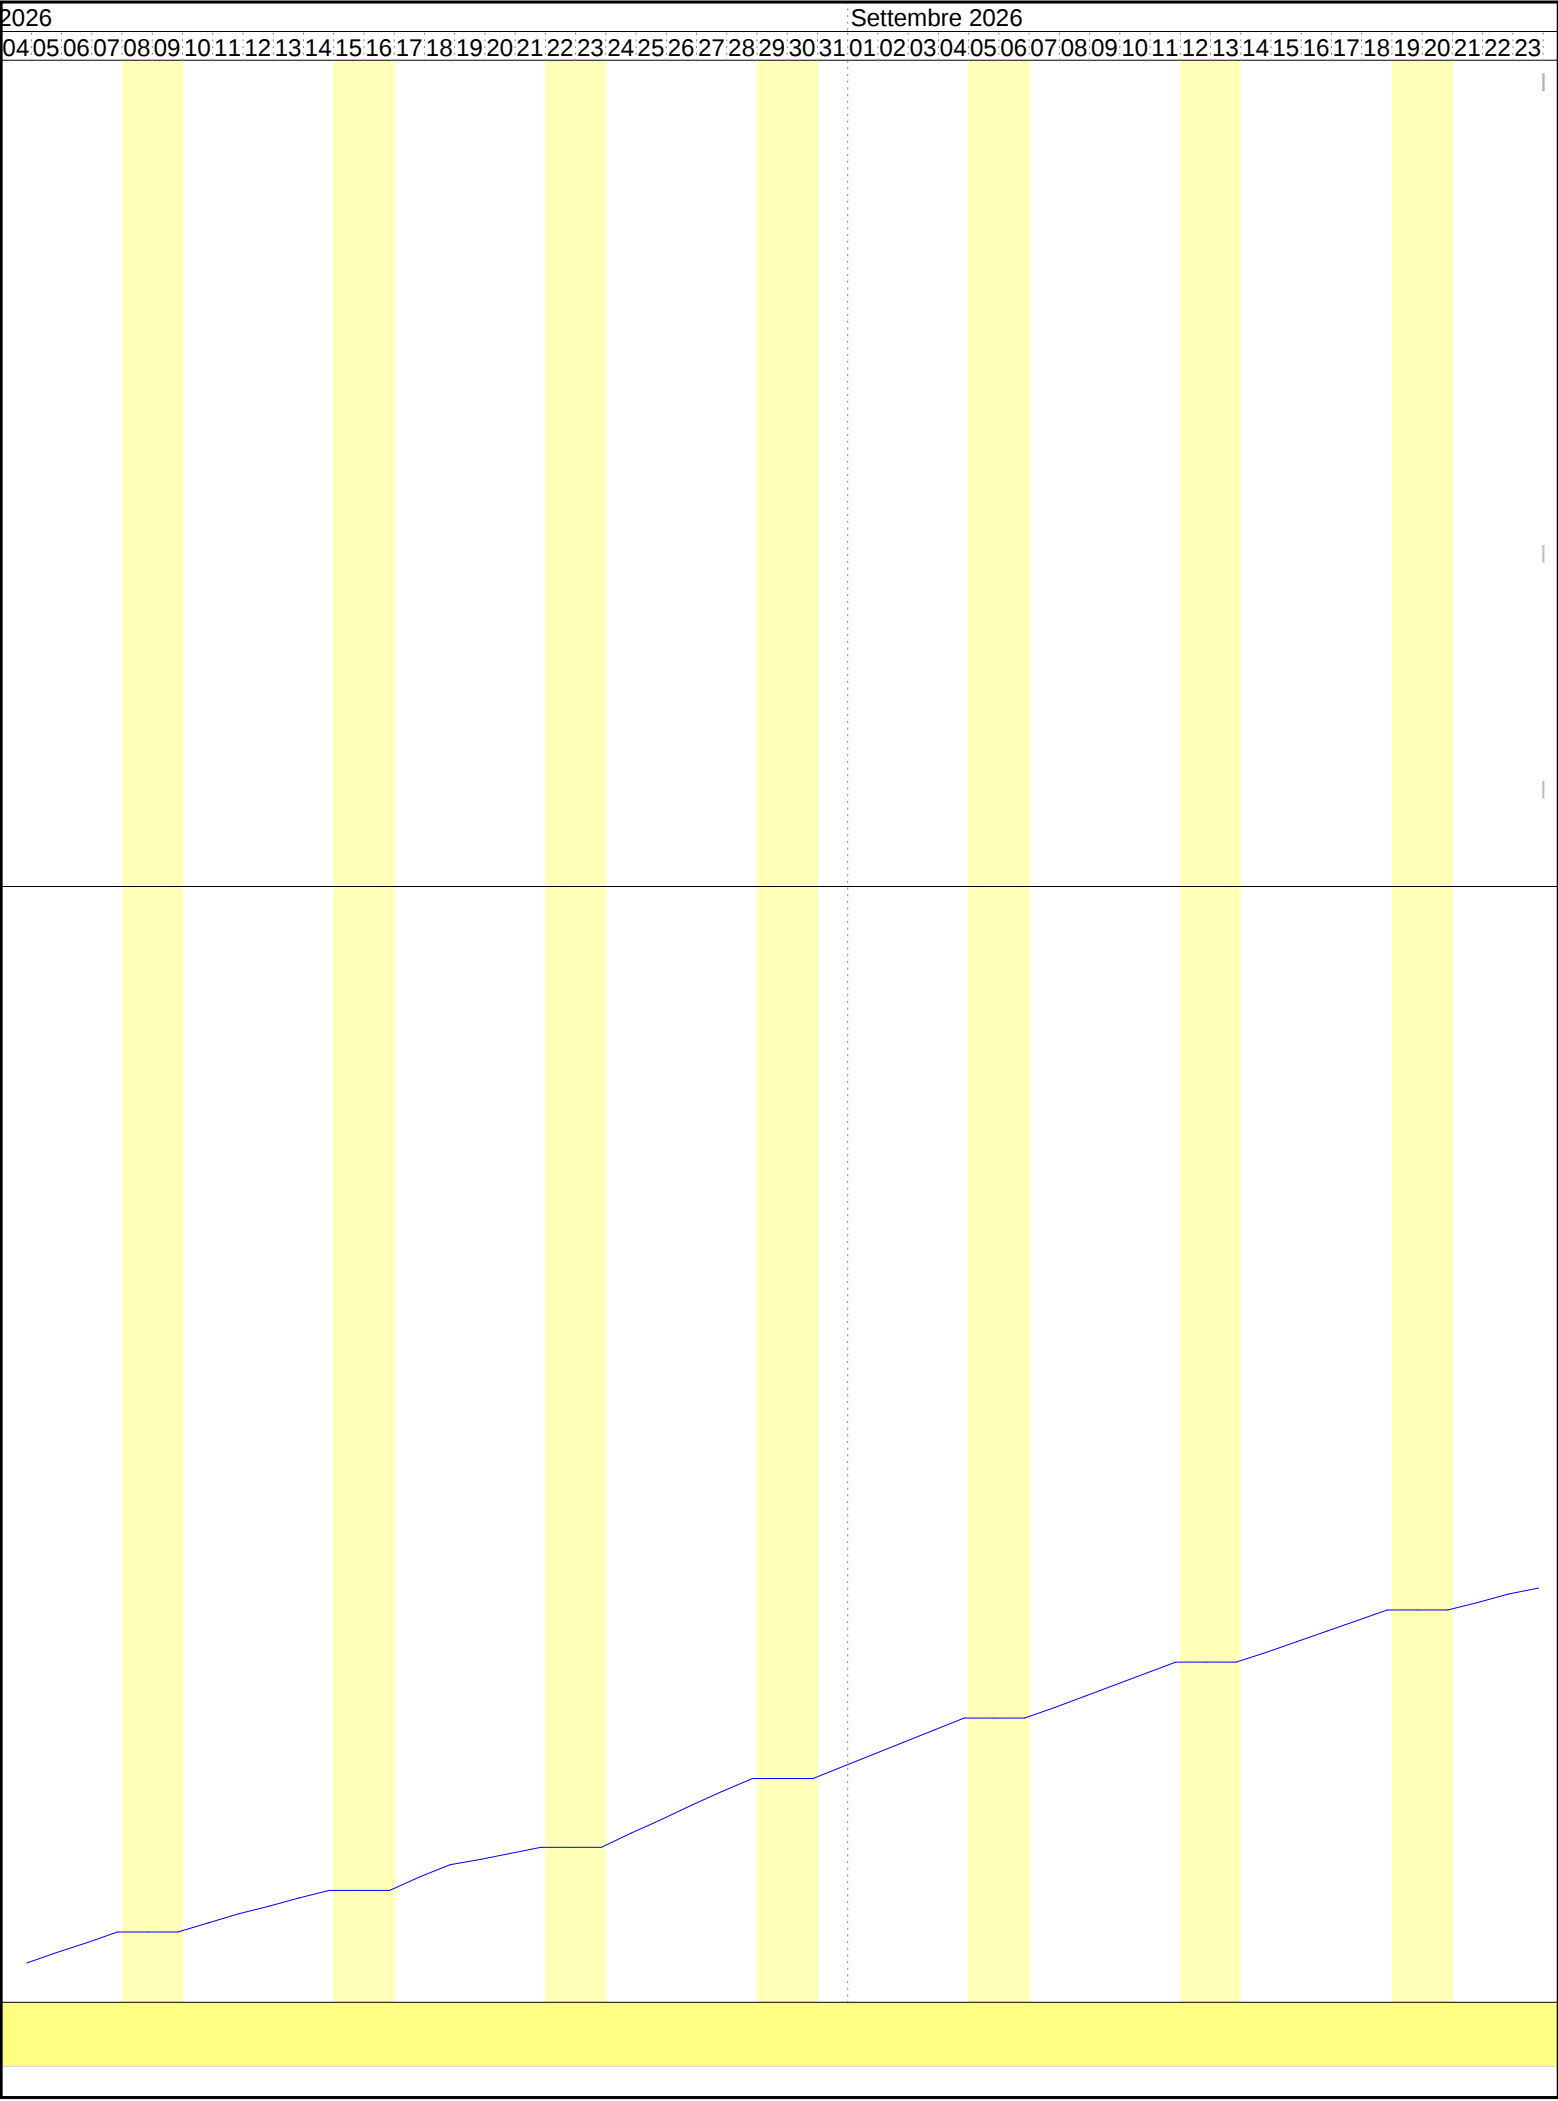


Novembre 2026

Ottobre 2026


Novembre 2026

24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13



Ottobre 2026

Novembre 2026

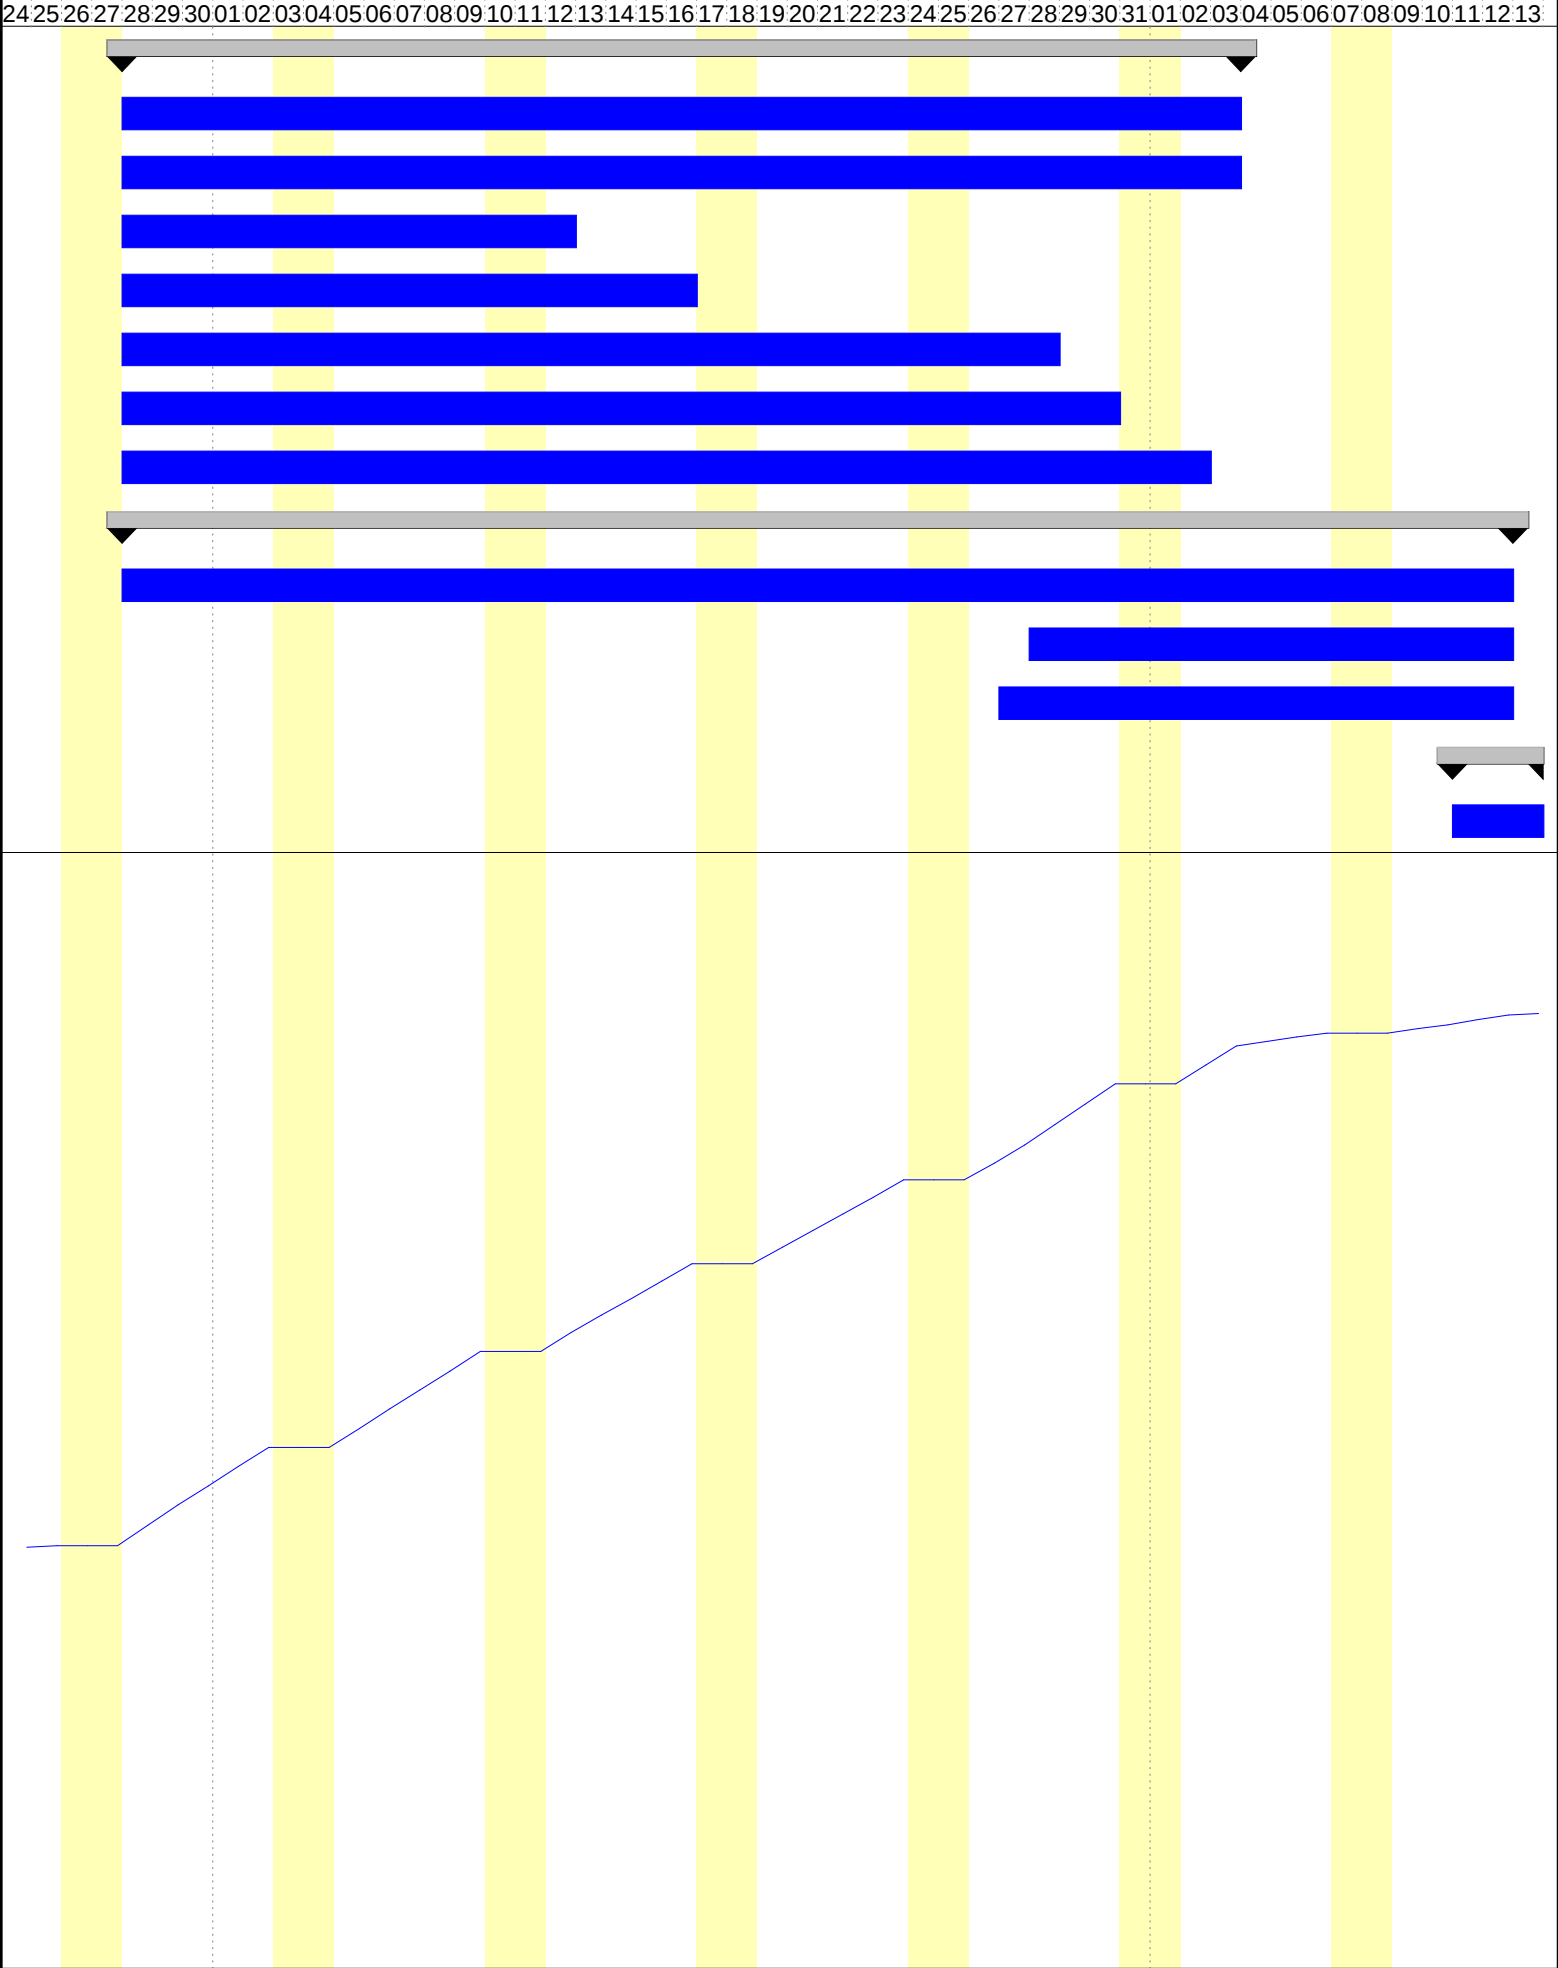

[illegible]

[illegible]

Dicembre 2026

Gennaio


14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

The diagram consists of a horizontal line spanning the width of the frame. Above this line, a blue curve is plotted, which is slightly wavy and remains relatively flat. The background is composed of vertical stripes of alternating yellow and white. A small gray square is located on the left edge of the frame, near the top.

io 2027

Febbraio 2027

04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

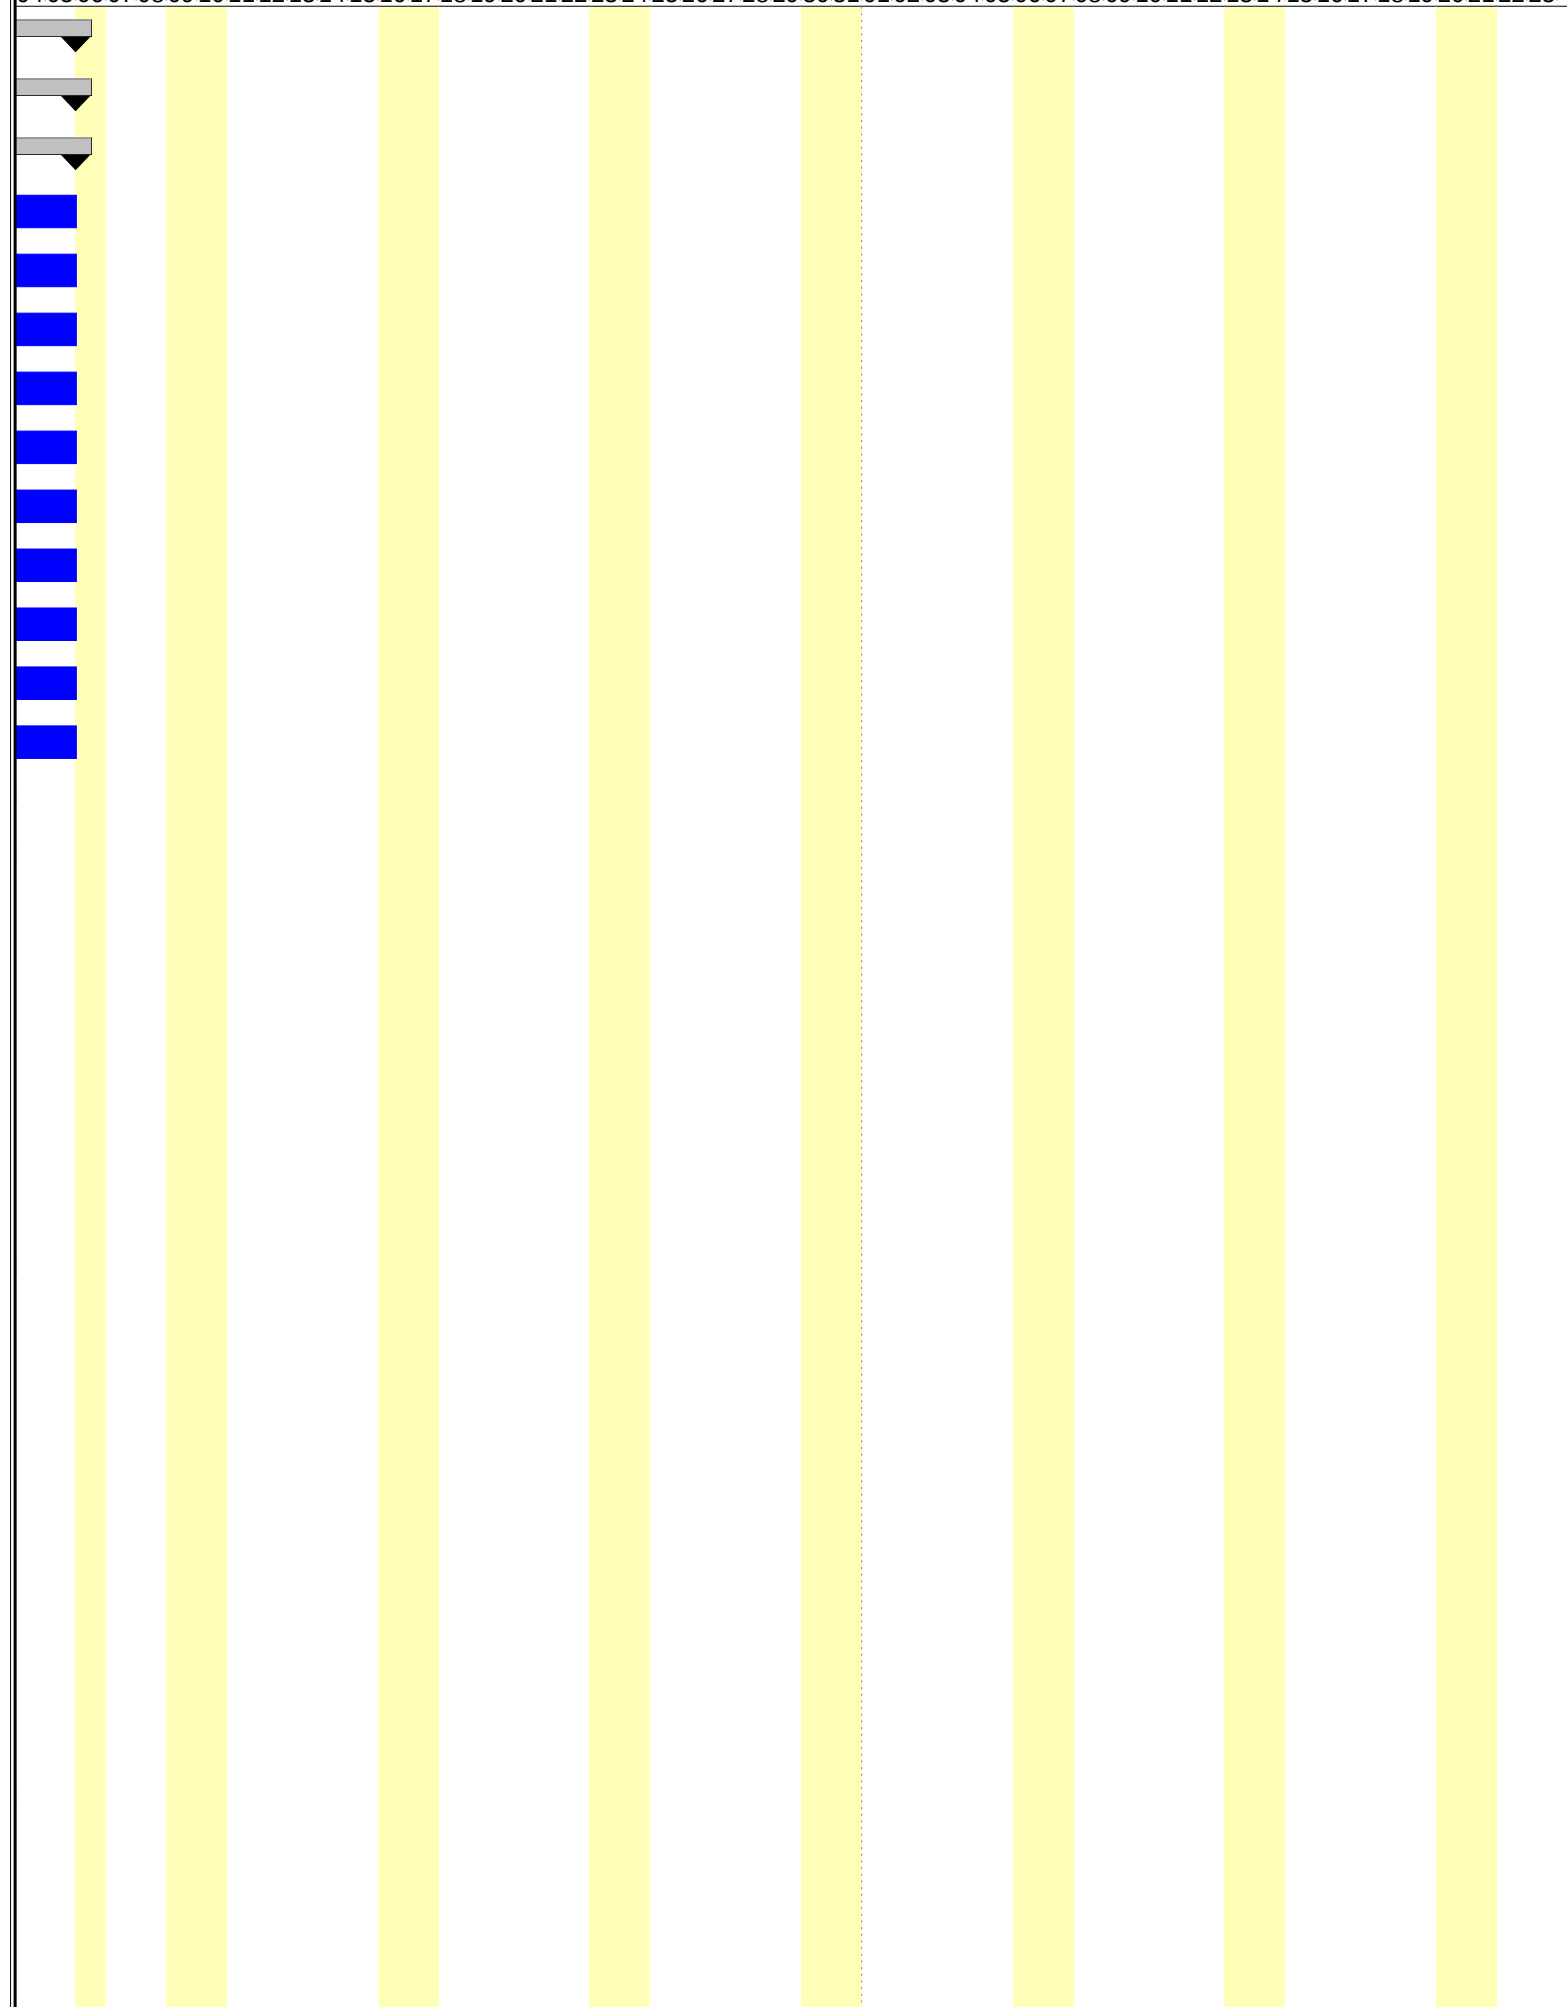

io 2027

Febbraio 2027

0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	3	2	4	2	5	2	6	2	7	2	8	2	9	3	0	3	1	0	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

io 2027

Febbraio 2027

0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	3	2	4	2	5	2	6	2	7	2	8	2	9	3	0	3	1	0	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

Comune di Porto Mantovano

Provincia di Mantova

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Piazze comunali bando a favore dei Distretti del Commercio Regione Lombardia 2026

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

, 17/07/2026

Il Tecnico
()

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	278'788,55	100,000	17/07/2026	05/01/2027	120	173
* SICUREZZA	6'249,95	2,242	17/07/2026	05/01/2027	120	173
** sicurezza	6'249,95	2,242	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzion ... cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	678,55	0,243	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghez ... misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1'518,00	0,544	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 ... misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	759,00	0,272	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastic ... cassone con gru. SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	278,71	0,100	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] = 200. Incluso: ... misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	781,00	0,280	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato ... LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.	1'190,00	0,427	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica ge ... per la certificazione EN 61-439 LV Installazione.	425,18	0,153	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale gen ... ase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio LV Posa.	143,31	0,051	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA: Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = ... mm²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda LV Posa.	26,20	0,009	17/07/2026	05/01/2027	120	173
*** OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... P.01.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione.	450,00	0,161	17/07/2026	05/01/2027	120	173
* OPERE EDILI	272'538,60	97,758	20/07/2026	13/11/2026	85	117
** economie e assistenze	2'049,79	0,735	20/07/2026	31/07/2026	10	12
*** Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECI ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	328,08	0,118	20/07/2026	23/07/2026	4	4
*** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	40,13	0,014	23/07/2026	27/07/2026	3	5
*** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	254,70	0,091	23/07/2026	29/07/2026	5	7
*** Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto ... operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	740,96	0,266	24/07/2026	31/07/2026	6	8
*** Autogrù telescopica; sbraccio [m] = 16; portata [t] = 15.	480,64	0,172	28/07/2026	31/07/2026	4	4
*** Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a); portata [t] = 15,0	205,28	0,074	28/07/2026	31/07/2026	4	4
** rimozioni	3'642,59	1,307	24/07/2026	07/08/2026	11	15
*** OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rim ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	342,32	0,123	29/07/2026	29/07/2026	1	1
*** OPERA: Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Cap ... to. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,5.	35,02	0,013	29/07/2026	29/07/2026	1	1
*** OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: depos ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	71,04	0,025	24/07/2026	24/07/2026	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria: ... pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	78,28	0,028	27/07/2026	31/07/2026	5	5
* * * OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio. Escluso: ope ... escavatore cingolato; potenza [kW] = 15,7; peso [t] = 1,8.	1'647,87	0,591	27/07/2026	31/07/2026	5	5
* * * Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discar ... i distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	144,09	0,052	24/07/2026	24/07/2026	1	1
* * * Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	590,05	0,212	31/07/2026	31/07/2026	1	1
* * * OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale ge ... pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	733,92	0,263	03/08/2026	07/08/2026	5	5
* * demolizioni	29'644,30	10,633	03/08/2026	18/08/2026	12	16
* * * OPERA: Strato di sottofondo, leggermente armato di conglo ... 01 ÷ 13000. RT Martello ad aria compressa; peso [kg] = 19.	2'295,05	0,823	03/08/2026	11/08/2026	7	9
* * * Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	622,11	0,223	03/08/2026	07/08/2026	5	5
* * * Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	2'967,26	1,064	03/08/2026	07/08/2026	5	5
* * * Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per ... iesel. Per profondità di taglio:- da 0 (zero) fino a 50 mm	94,92	0,034	03/08/2026	07/08/2026	5	5
* * * OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminos ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	8'448,00	3,030	03/08/2026	07/08/2026	5	5
* * * OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. ... carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio..	3'420,00	1,227	10/08/2026	17/08/2026	6	8
* * * OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale gener ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	5'140,80	1,844	10/08/2026	18/08/2026	7	9
* * * Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	640,80	0,230	10/08/2026	18/08/2026	7	9
* * * Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discar ... i distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	3'734,40	1,340	10/08/2026	18/08/2026	7	9
* * * Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati	2'280,96	0,818	10/08/2026	18/08/2026	7	9
* * scavi	10'697,50	3,837	17/08/2026	28/08/2026	10	12
* * * Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- ... e residuo secco per l'espressione dei dati ex D.lgs 152/06	30,08	0,011	17/08/2026	21/08/2026	5	5
* * * Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	67,70	0,024	17/08/2026	21/08/2026	5	5
* * * OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti r ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	4'941,60	1,773	17/08/2026	21/08/2026	5	5
* * * OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. I ... utocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	2'487,00	0,892	17/08/2026	28/08/2026	10	12
* * * Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti d ... ne Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m	316,00	0,113	17/08/2026	28/08/2026	10	12
* * * Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolt ... e scale, escluso il carico sull'automezzo:- da piano terzo	181,12	0,065	17/08/2026	26/08/2026	8	10

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discar ... i distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	2'178,40	0,781	17/08/2026	26/08/2026	8	10
* * * Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	495,60	0,178	17/08/2026	26/08/2026	8	10
* * sottoservizi e impianti	16'731,12	6,001	24/08/2026	18/09/2026	20	26
* * * OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni co ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] = 90; peso [t] = 19.	367,20	0,132	24/08/2026	17/09/2026	19	25
* * * OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); ... fianco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] = 55.	4'456,00	1,598	24/08/2026	18/09/2026	20	26
* * * Riempimento fondo scavo e rinfiacco tubazioni realizzato ... schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm ² ; eseguito:- in trincea	3'040,40	1,091	24/08/2026	18/09/2026	20	26
* * * Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ca ... ello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa	2'857,80	1,025	24/08/2026	18/09/2026	20	26
* * * OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione el ... P Escavatore cingolato; potenza [kW] = 120; peso [t] = 20.	1'390,00	0,499	24/08/2026	11/09/2026	15	19
* * * OPERA: Canaletta di metallo generico; geometria: andament ... scavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1'065,90	0,382	24/08/2026	16/09/2026	18	24
* * * PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm	1'021,30	0,366	24/08/2026	10/09/2026	14	18
* * * Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECI ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1'312,32	0,471	24/08/2026	18/09/2026	20	26
* * * OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m ²] = 0 ... pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	577,40	0,207	24/08/2026	17/09/2026	19	25
* * * OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m ²] = 0 ... pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	642,80	0,231	24/08/2026	18/09/2026	20	26
* * sottofondi	57'862,15	20,755	24/08/2026	29/09/2026	27	37
* * * Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: dr ... otessile di plastica polipropilene (PP); peso [g/m ²] = 140	851,40	0,305	24/08/2026	24/09/2026	24	32
* * * OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di r ... utocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	10'682,54	3,832	24/08/2026	22/09/2026	22	30
* * * Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... ità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.	2'447,95	0,878	24/08/2026	04/09/2026	10	12
* * * OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generic ... urazione per ogni installazione. LV LAVORO: Installazione.	435,86	0,156	24/08/2026	11/09/2026	15	19
* * * OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diamet ... aggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV Formazione.	33'475,65	12,008	24/08/2026	24/09/2026	24	32
* * * OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acci ... cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	9'968,75	3,576	24/08/2026	29/09/2026	27	37
* * pavimentazioni	133'955,99	48,049	28/09/2026	03/11/2026	27	37
* * * Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico ... ri in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero	31'087,50	11,151	28/09/2026	03/11/2026	27	37
* * * OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	86'450,00	31,009	28/09/2026	03/11/2026	27	37
* * * OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generi ... P						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	6'759,00	2,424	28/09/2026	12/10/2026	11	15
* * * Cordoli in granito con piano e coste finite: con le due t ... rate a spacco di cava: retti in vista con sezione 12x25 cm	1'110,00	0,398	28/09/2026	16/10/2026	15	19
* * * OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno natu ... a dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	552,19	0,198	28/09/2026	28/10/2026	23	31
* * * OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizi ... ità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	6'684,30	2,398	28/09/2026	30/10/2026	25	33
* * * Ripristino della continuità della pavimentazione in congl ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1'313,00	0,471	28/09/2026	02/11/2026	26	36
* * opere a verde	17'212,84	6,174	28/09/2026	12/11/2026	34	46
* * * OPERA: Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	4'480,00	1,607	28/09/2026	12/11/2026	34	46
* * * OPERA: Terreno di terra generico; superficie [m²] = 2500; ... ice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	7'825,00	2,807	28/10/2026	12/11/2026	12	16
* * * OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo la ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	4'907,84	1,760	27/10/2026	12/11/2026	13	17
* * segnaletica	742,32	0,266	11/11/2026	13/11/2026	3	3
* * * OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	742,32	0,266	11/11/2026	13/11/2026	3	3
Data, 17/07/2026						
Tecnico						

Comune di Porto Mantovano

Provincia di Mantova

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Piazze comunali bando a favore dei Distretti del Commercio Regione Lombardia 2026

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

, 17/07/2026

Il Tecnico
()

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
17/07/2026	52,08	52,08	0,019
20/07/2026	134,10	186,19	0,067
21/07/2026	134,10	320,29	0,115
22/07/2026	134,10	454,39	0,163
23/07/2026	198,42	652,81	0,234
24/07/2026	455,02	1'107,83	0,397
27/07/2026	585,13	1'692,96	0,607
28/07/2026	743,23	2'436,19	0,874
29/07/2026	1'120,57	3'556,75	1,276
30/07/2026	692,29	4'249,04	1,524
31/07/2026	1'282,33	5'531,37	1,984
03/08/2026	2'953,19	8'484,56	3,043
04/08/2026	2'953,19	11'437,75	4,103
05/08/2026	2'953,19	14'390,94	5,162
06/08/2026	2'953,19	17'344,12	6,221
07/08/2026	2'953,18	20'297,30	7,281
10/08/2026	2'635,23	22'932,53	8,226
11/08/2026	2'635,22	25'567,75	9,171
12/08/2026	2'307,36	27'875,12	9,999
13/08/2026	2'307,36	30'182,48	10,826
14/08/2026	2'307,36	32'489,84	11,654
17/08/2026	3'952,43	36'442,27	13,072
18/08/2026	3'382,43	39'824,70	14,285
19/08/2026	1'697,15	41'521,85	14,894
20/08/2026	1'697,15	43'219,00	15,502
21/08/2026	1'697,15	44'916,15	16,111
24/08/2026	4'138,22	49'054,37	17,596
25/08/2026	4'138,22	53'192,58	19,080
26/08/2026	4'138,22	57'330,80	20,564
27/08/2026	3'781,33	61'112,13	21,921
28/08/2026	3'781,33	64'893,46	23,277
31/08/2026	3'501,03	68'394,48	24,533
01/09/2026	3'501,03	71'895,51	25,789
02/09/2026	3'501,03	75'396,54	27,044
03/09/2026	3'501,03	78'897,56	28,300
04/09/2026	3'501,03	82'398,60	29,556
07/09/2026	3'256,23	85'654,83	30,724
08/09/2026	3'256,23	88'911,06	31,892
09/09/2026	3'256,23	92'167,29	33,060
10/09/2026	3'256,23	95'423,53	34,228
11/09/2026	3'183,29	98'606,81	35,370
14/09/2026	3'061,56	101'668,37	36,468
15/09/2026	3'061,56	104'729,93	37,566
16/09/2026	3'061,56	107'791,49	38,664
17/09/2026	3'002,35	110'793,84	39,741
18/09/2026	2'952,63	113'746,47	40,800
21/09/2026	2'337,16	116'083,63	41,639
22/09/2026	2'337,16	118'420,79	42,477
23/09/2026	1'851,59	120'272,38	43,141
24/09/2026	1'851,60	122'123,97	43,805
25/09/2026	421,30	122'545,27	43,956
28/09/2026	5'936,64	128'481,90	46,086
29/09/2026	5'936,63	134'418,54	48,215
30/09/2026	5'567,42	139'985,96	50,212
01/10/2026	5'567,42	145'553,38	52,209
02/10/2026	5'567,42	151'120,81	54,206
05/10/2026	5'567,42	156'688,23	56,203
06/10/2026	5'567,42	162'255,65	58,200
07/10/2026	5'567,42	167'823,08	60,197
08/10/2026	5'567,42	173'390,50	62,194
09/10/2026	5'567,42	178'957,92	64,191
12/10/2026	5'567,42	184'525,34	66,188
13/10/2026	4'952,97	189'478,31	67,965
14/10/2026	4'952,97	194'431,28	69,741
15/10/2026	4'952,97	199'384,25	71,518
16/10/2026	4'952,97	204'337,21	73,295

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
19/10/2026	4'878,97	209'216,18	75,045
20/10/2026	4'878,97	214'095,15	76,795
21/10/2026	4'878,97	218'974,12	78,545
22/10/2026	4'878,97	223'853,09	80,295
23/10/2026	4'878,97	228'732,06	82,045
26/10/2026	4'878,97	233'611,02	83,795
27/10/2026	5'256,49	238'867,52	85,681
28/10/2026	5'908,58	244'776,10	87,800
29/10/2026	5'884,57	250'660,67	89,911
30/10/2026	5'884,57	256'545,24	92,021
02/11/2026	5'617,20	262'162,44	94,036
03/11/2026	5'566,70	267'729,13	96,033
04/11/2026	1'213,46	268'942,59	96,468
05/11/2026	1'213,46	270'156,05	96,904
06/11/2026	1'213,46	271'369,50	97,339
09/11/2026	1'213,46	272'582,96	97,774
10/11/2026	1'213,46	273'796,42	98,209
11/11/2026	1'460,90	275'257,31	98,733
12/11/2026	1'460,89	276'718,21	99,257
13/11/2026	299,52	277'017,73	99,365
16/11/2026	52,08	277'069,81	99,383
17/11/2026	52,08	277'121,90	99,402
18/11/2026	52,08	277'173,98	99,421
19/11/2026	52,08	277'226,06	99,440
20/11/2026	52,08	277'278,15	99,458
23/11/2026	52,08	277'330,23	99,477
24/11/2026	52,08	277'382,31	99,496
25/11/2026	52,08	277'434,39	99,514
26/11/2026	52,08	277'486,48	99,533
27/11/2026	52,08	277'538,56	99,552
30/11/2026	52,08	277'590,64	99,570
01/12/2026	52,08	277'642,73	99,589
02/12/2026	52,08	277'694,81	99,608
03/12/2026	52,08	277'746,89	99,626
04/12/2026	52,08	277'798,97	99,645
07/12/2026	52,08	277'851,06	99,664
09/12/2026	52,08	277'903,14	99,682
10/12/2026	52,08	277'955,22	99,701
11/12/2026	52,08	278'007,31	99,720
14/12/2026	52,08	278'059,39	99,738
15/12/2026	52,08	278'111,47	99,757
16/12/2026	52,08	278'163,55	99,776
17/12/2026	52,08	278'215,64	99,795
18/12/2026	52,08	278'267,72	99,813
21/12/2026	52,08	278'319,80	99,832
22/12/2026	52,08	278'371,89	99,851
23/12/2026	52,08	278'423,97	99,869
24/12/2026	52,08	278'476,05	99,888
28/12/2026	52,08	278'528,14	99,907
29/12/2026	52,08	278'580,22	99,925
30/12/2026	52,08	278'632,30	99,944
31/12/2026	52,08	278'684,38	99,963
04/01/2027	52,08	278'736,47	99,981
05/01/2027	52,08	278'788,55	100,000
Data, 17/07/2026			
Tecnico			
